Comune di SAN GIUSTO CANAVESE
Provincia di Torino

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO ANNO 2017

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

Data, 12/10/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI - DIAGRAMMA DI GANTT

	A	B	C
3		GIORNI	
4	FASE	FASE LAVORATIVA	
5	1	ALLESTIMENTO CANTIERE (INSTALLAZIONE SEGNALETICA, PONTEGGIO, INSTALLAZIONE GRU, IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA DEL CANTIERE, RECINZIONI, DELIMITAZIONI) SMOBILITAZIONE CANTIERE A FINE LAVORI	PREVISTO
6			EFFETTIVO
7	2	SMONTAGGIO COPERTURA ESISTENTE	PREVISTO
8			EFFETTIVO
9	3	MURATURA ESTERNA PER SOPRAELEVAZIONE	PREVISTO
10			EFFETTIVO
11	4	COSTRUZIONE NUOVA COPERTURA CON ORDITURA IN LEGNO LAMELLARE PRETAGLIATO	PREVISTO
12			EFFETTIVO
13	5	GRONDAIE E LATTONERIE	PREVISTO
14			EFFETTIVO
15	6	INTONACI ESTERNI	PREVISTO
16			
17	7	TINTEGGIATURA ESTERNA	
18			EFFETTIVO
19	8	SMONTAGGIO PONTEGGIO	PREVISTO
20			EFFETTIVO
21	9	Tramezzi interni	PREVISTO
22			EFFETTIVO
23	10	impianto idro-termo-sanitario	PREVISTO
24			EFFETTIVO
25	11	impianto elettrico	PREVISTO
26			EFFETTIVO
27	12	intonaci interni	PREVISTO
28			EFFETTIVO
29	13	sottofondi, pavimenti e rivestimenti	PREVISTO
30			EFFETTIVO
31	14	SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI	PREVISTO
32			EFFETTIVO
33	15	TINTEGGIATURA INTERNA	PREVISTO
34			EFFETTIVO
35	16	SMOBILITAZIONE CANTIERE E PULIZIA	PREVISTO
36			EFFETTIVO

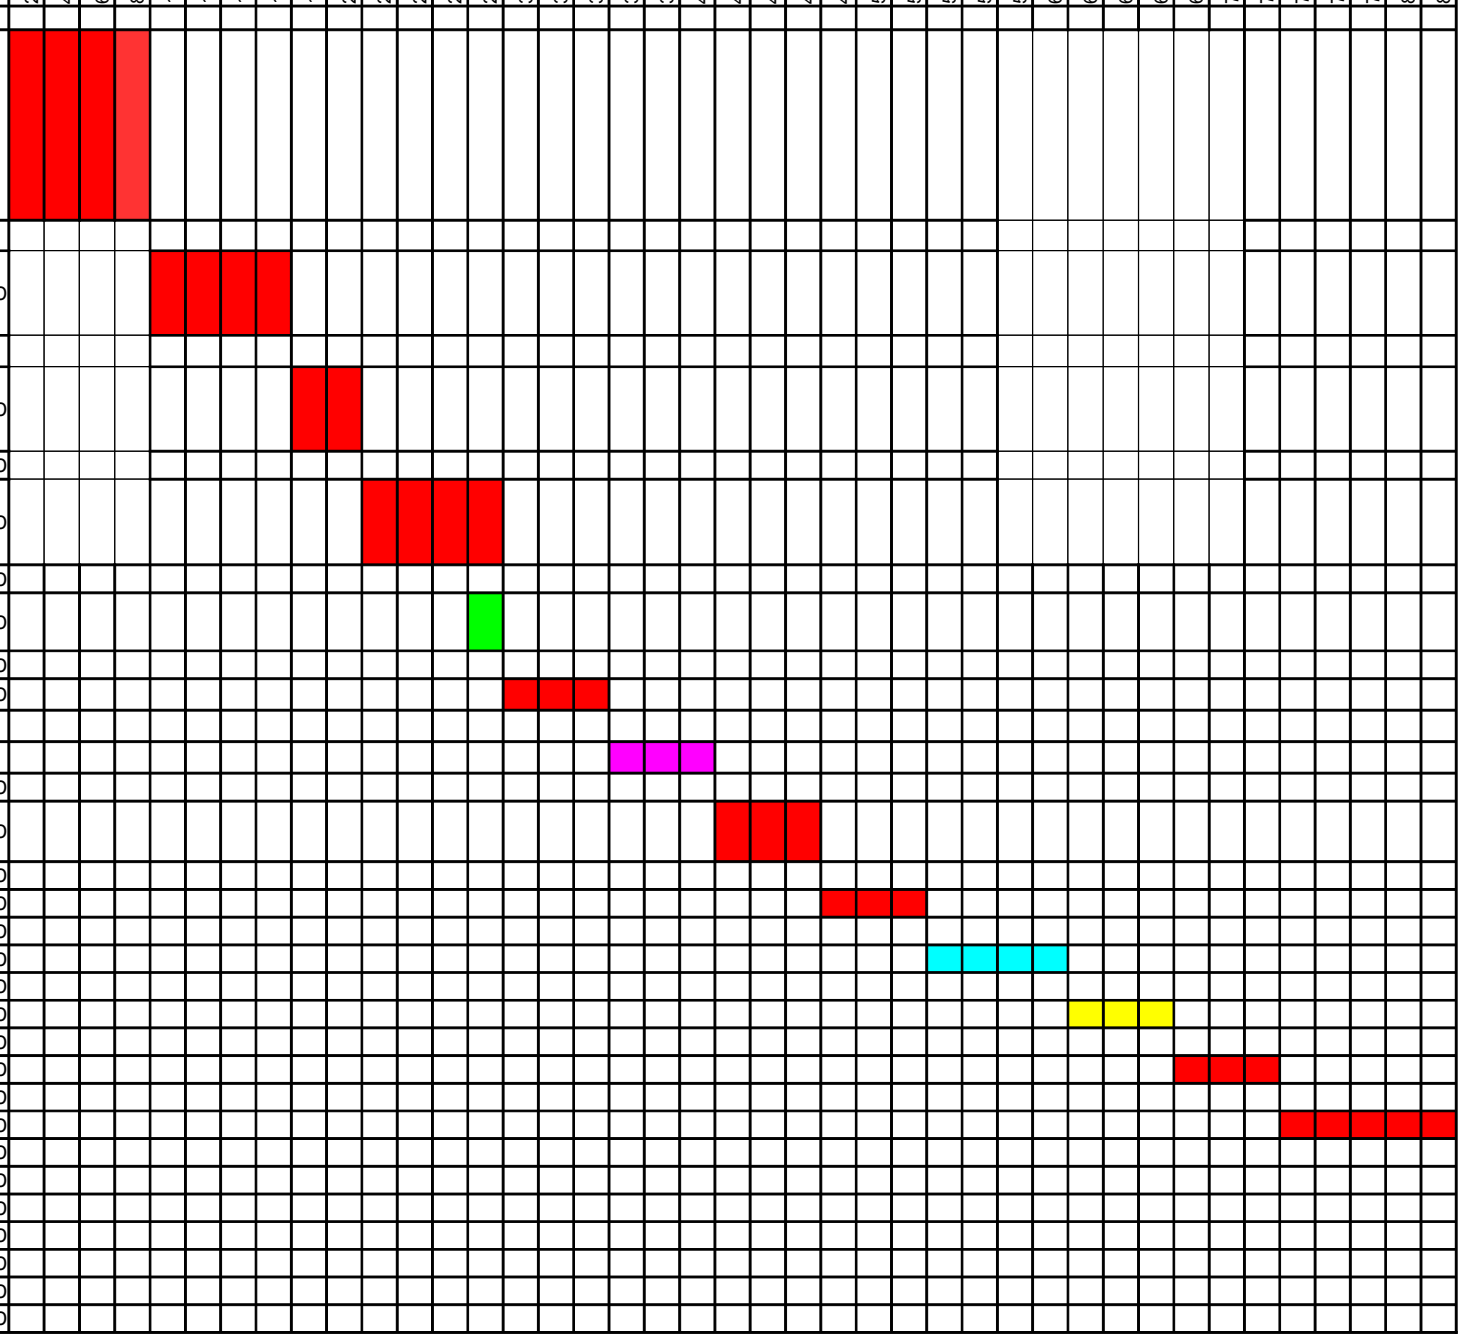

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI - DIAGRAMMA DI GANTT

FASE	FASE LAVORATIVA / GIORNI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1	ALLESTIMENTO CANTIERE (INSTALLAZIONE SEGNALETICA, INSTALLAZIONE BARACCAMENTI CANTIERE, RECINZIONI, DELIMITAZIONI, PROTEZIONE PASSAGGI PEDONALI; SMOBILITAZIONE CANTIERE A FINE LAVORI	PREVISTO																																																				
		EFFETTIVO																																																					
2	TAGLIO ASFALTO	PREVISTO																																																				
		EFFETTIVO																																																					
3	SCAVI, SCARIFICHE	PREVISTO																																																					
		EFFETTIVO																																																					
4	PULIZIA	PREVISTO																																																					
		EFFETTIVO																																																					
5	RULLATURA PIAZZA	PREVISTO																																																					
		EFFETTIVO																																																					
6	STESA DI MANTI BITUMINOSI	PREVISTO																																																					
		EFFETTIVO																																																					
7	POSIZIONAMENTO IN QUOTA DI GRIGLIE, POZZETTI, CHIUSINI, ECC.	PREVISTO																																																					
		EFFETTIVO																																																					

AREE DI INTERVENTO

- PIAZZA DELLA LIBERTA'
- VIA CAPPO
- VIA VENEZIA
- CIMITERO
- GENERICA
